

Dichtheitsprüfung Kabelschutzrohre DIN EN 1610

Durchgeführt durch:

Firma: HEXBEE Rohrtechnik
Straße: Sankt Stephan Straße 3
PLZ: 49661
Ort: Cloppenburg
Internet:
E-Mail: info@hexbee.de

Baustellendaten:

Baustellenname: Leerrohrtrasse Musterstadt
Adresse: Musterweg, 12345 Musterstadt
Auftraggeber: Muster Tiefbau GmbH
Auftragsnummer: 2026-0412
Name Bauleiter: M. Mustermann
Name Prüfer: E. Musterfrau
GPS-Daten: no GPS

Messgerät:

Messbereich: 0 ... 7 bar
Serien-Nr: 231-15036 / V5.10.3-1242
Letzte Kalibrierung: 17.09.2026
Nächste Kalibrier.: 17.09.2028

Prüfverfahren:

LC --> 0,1 bar

Rohrdaten:

Rohrtyp: KKR 110x3,2
Rohr-Information: Rohr 3 von 4
Rohrlänge [m]: 48.00
Anzahl Rohre: 1
Startschacht: S 12
Zielschacht: S 13

Prüfungsdaten:

Start der Prüfung: 22.09.2026 17:07:18
Ende der Prüfung: 22.09.2026 17:15:26
Gerätetemperatur Start: 28°C
Gerätetemperatur Ende: 28°C
Prüfdruck soll: 0.100 bar
Dauer Beruhigungszeit (Phase2): 00:01:00 h
Druck nach Beruh.zeit (Phase2): 0.1001 bar
Dauer Hauptprüfung (Phase3): 00:03:00 h
Druck nach Hauptprüf. (Phase3): 0.0993 bar
Druckabfall Hauptpr. delta-p-max: 0.0150 bar
Druckabfall Hauptpr. delta-p-ist: 0.0008 bar


Werte:

Abweichung:

Bemerkung:

Ergebnis: Prüfkriterien erfüllt

Druck [bar]

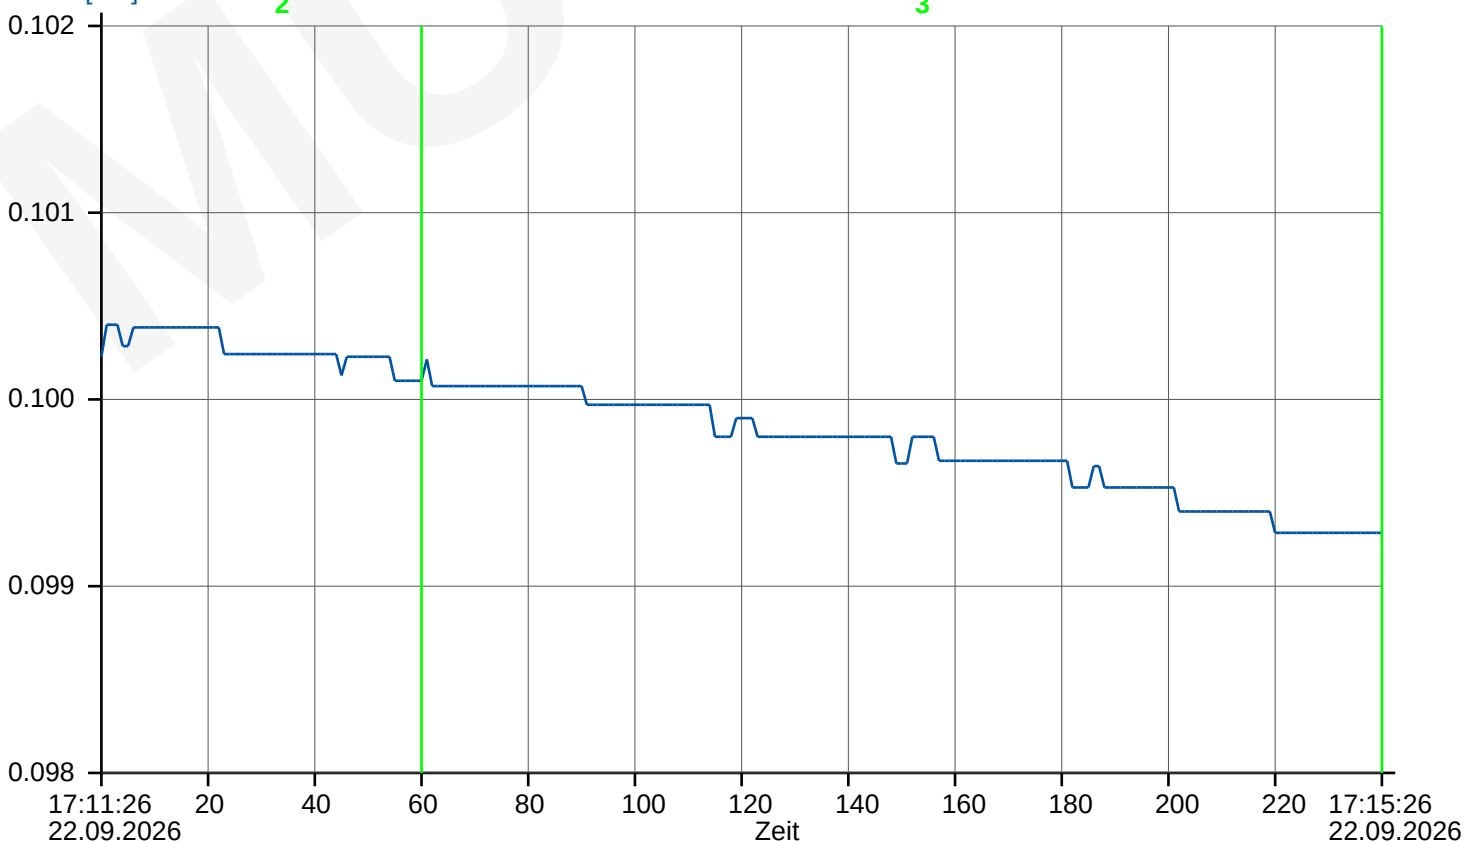

Erstellt mit DPG_17U

Muster: Angaben zu Baustelle, Beteiligten und Rohrzug erfunden
